

***Stand van zaken
Programma's
Eerste management rapportage 2022***



Leeswijzer

In dit document wordt de voortgang van de programma's weergegeven. Elk programma kent een eigen stuurgroep met bestuurlijk, ambtelijk opdrachtgever en programmaleider.

Een programma is een verzameling van deelprojecten en activiteiten. De deelprojecten worden rechtstreeks aangestuurd via de stuurgroep. Voor wat betreft de opgenomen lijnactiviteiten vindt er coördinatie plaats.

Vanwege de vele deelprojecten per programma is het niet mogelijk om een algemene stoplichten rapportage weer te geven. Daarom wordt per programma in een separate rapportage weergegeven aangegeven of de deelprojecten naar wens verlopen (groen) hetzij dat er aandachtspunten zijn (oranje).

Deze rapportages zijn per programma volgordeijk opgenomen in dit document volgens de hieronder aangegeven volgorde.


- 1 Omgevingswet
- 2 Duurzaamheid
- 3 Sociaal Domein

Naam programma: Omgevingswet	
Bestuurlijk opdrachtgever	J. Groothuis
Overige leden Stuurgroep	W. Stoffer, A. Dickhof (agendalid Teamleiders VTH en Informatie)
Ambtelijk opdrachtgever	A. Dickhof
Projectleider	J. Schoonhoven

Aanleiding
<p>Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Omgevingswet’ aangenomen, op 22 maart 2016 is de wet door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet beoogt een forse stelselherziening, waarin 26 wetten worden gebundeld in één wet en de huidige 120 Amvb’s tot 4 worden teruggebracht. De inwerkingtreding wordt voorzien op 1 juli 2023, nadat de wet al een aantal keer is uitgesteld. . Ook over deze datum is nog geen 100% duidelijkheid. De Eerste Kamer moet eerst instemmen met deze datum van inwerkingtreding en zal dit op zijn vroegst pas in oktober 2022 doen. Een aantal zaken moet geregeld zijn op het moment dat de wet in werking treedt, maar voor o.a. de omgevingsvisie en het omgevingsplan geldt een ruime overgangperiode.</p> <p>Vanaf de derde hoofdlijnenrapportage 2021 worden deelprojecten en lijnactiviteiten m.b.t. de voorbereiding op de Omgevingswet beschreven en wordt de voortgang via de stoplichtenrapportage gemonitord.</p>

Voortgang op hoofdlijnen			
Fase	Gewenst product	Planning	Resultaat
oriëntatie	startnotitie	Voorjaar 2021	Notitie Omgevingswet en gemeenteraad
voorbereiding	projectplan	Voorjaar 2021	20210101 Plan van Aanpak Omgevingwet gemeente Nunspeet def
uitvoering	uitvoeren projectplan	2021-2029	volgt
evaluatie	evaluatie notitie	2030	volgt

Voortgang van de fase waarin het programma zich bevindt
<p>Het project bevindt zich in de voorbereidings/uitvoeringsfase. Eind 2020 is er een plan van aanpak en programmaplanning vastgesteld. Vanaf 2021 wordt er gewerkt binnen een programmastructuur met een programmateam en een stuurgroep. Er zijn verschillende werkgroepen ingesteld die onderdelen van de implementatie oppakken. In het programmateam wordt afstemming gezocht tussen de verschillende onderdelen (zie onderstaand schema). De stuurgroep wordt gevraagd richting te geven op onderdelen. Er wordt uitgegaan van een consoliderende strategie bij de implementatie. Gemeentelijke kerninstrumenten uit de wet zijn: de omgevingsvisie, het omgevingsplan, de omgevingsvergunning en het programma.</p>

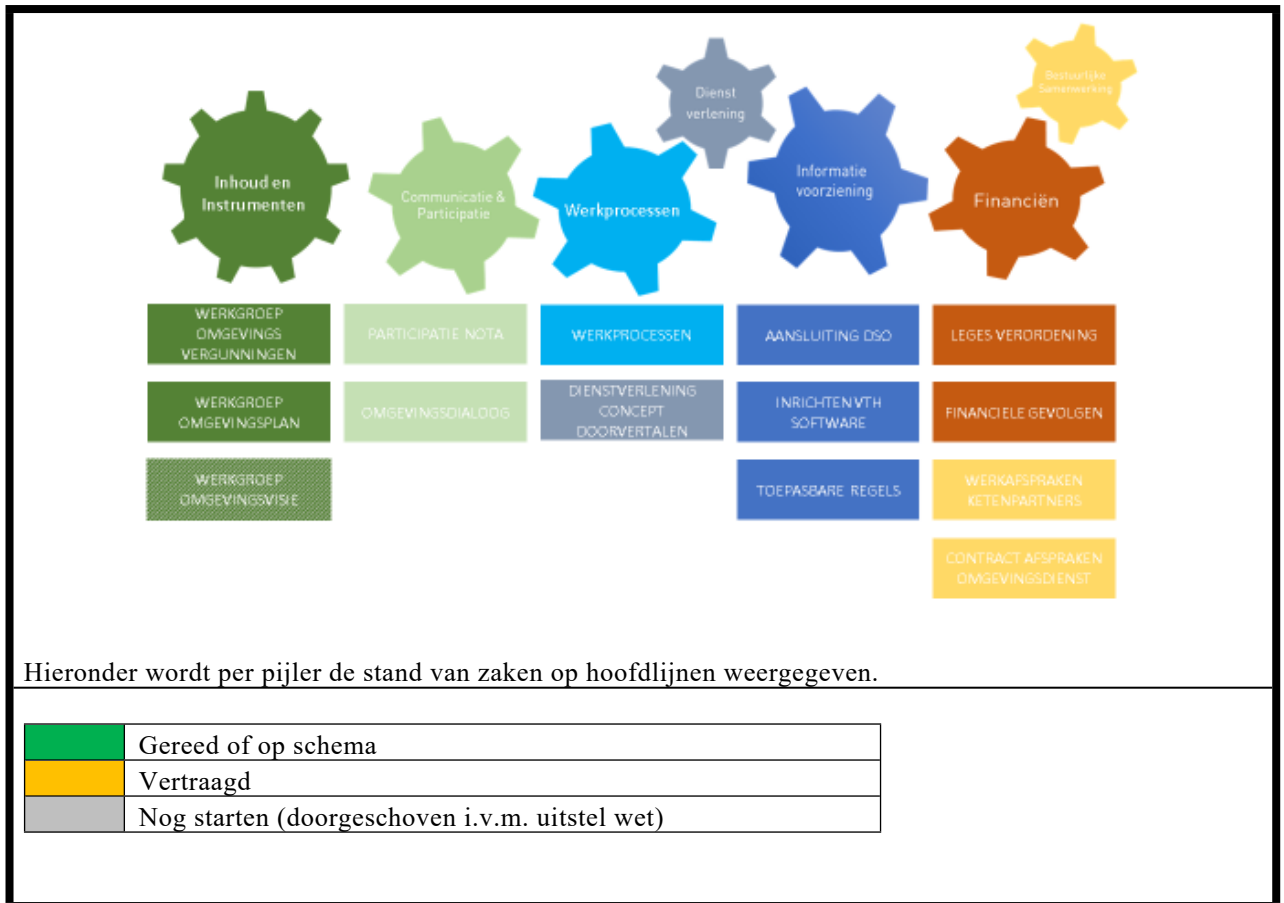

1. Programmamanagement			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning gereed</i>	<i>Groen/rood</i>
Plan van aanpak en programmaplanning o.b.v. minimale eisen Omgevingswet	Gereed. Elk kwartaal actualisatie programmaplanning.	December 2020	
Rapportage voortgang	Loopt via hoofdlijnenrapportage	Periodiek tot einde overgangperiode	
Plan van aanpak veranderopgave na 1 januari 2023 tot 2030	Opstellen aan het einde van de voorbereidingsperiode	Najaar 2022	

2. Financiën			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning gereed</i>	<i>Groen/rood</i>
Financiële impact en wijzigingen Omgevingswet	Op hoofdlijnen in beeld. Periodiek overleg met Financiën. Meenemen in PvA na 1/1/2023.	Najaar 2022	
Legesverordening aanpassen	Verordening nieuwe stijl en o.b.v. modelverordening VNG in voorbereiding.	Najaar 2022	
Verordening Nadeelcompensatie	Concept in voorbereiding. Najaar naar college en raad.	Najaar 2022	

3. Inhoud en Instrumenten			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning gereed</i>	<i>Groen/rood</i>
Omgevingsvisie actualiseren	Actualisatie visie 2018 voor eind 2024 vereist. Starten met PvA.	Najaar 2022	
Omgevingsplan: software aanschaffen, koppelen en structuur bepalen	Gereed. Software aangeschaft/gekoppeld Structuur grotendeels bepaald.	Najaar 2021	
Omgevingsplan: Regels huidige gemeentelijke plannen en verordeningen inbrengen in het nieuw Omgevingsplan	Loopt via werkgroep omgevingsplan. Eerste wijziging van het plan is in voorbereiding.	Voorjaar 2023	
Omgevingsplan: werken met tijdelijk Omgevingsplan van rechtstwege	Loopt via werkgroep omgevingsplan.	Najaar 2022	
Omgevingsplan: bruidsschatregels bestuderen en planning voor inpassing Omg. plan	Bruidsschatregels op hoofdlijnen bestudeerd. Planning voor inpassing Omgevingsplan in voorbereiding. Bepalen wat meegaat in de eerste planwijziging.	Voorjaar 2023	
Omgevingsplan: planning voor definitief omgevingsplan per eind 2029	Nog starten	Najaar 2022	
Omgevingsplan: juridische vraagstukken bodem en grondzaken (aanvullingswetten)	Periodiek overleg met beleidsspecialisten loopt	Periodiek tot einde overgangperiode	
Programma: onderzoeken of dit instrument verplicht is voor Nunspeet	Gereed. Geen directe verplichting voor Nunspeet	Najaar 2021	
Delegatiebesluit en Bindend adviesrecht	Gereed. Vastgesteld door de raad.	Februari 2022	

vaststellen door Raad			
-----------------------	--	--	--

4. Dienstverlening			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning gereed</i>	<i>Groen/ rood</i>
Analyse klantreizen ruimtelijke domein	Gereed. Opgeleverd	Voorjaar 2021	
Optimalisering klantreizen ruimtelijk domein	Stappenplan en analyse klantreizen gereed. Bevindingen mee in o.a. werkprocessen. I.v.m. capaciteitsgebrek aanbevelingen pas na inwerkingtreding wet oppakken.	2023/2024	
Actualisatie visie op dienstverlening in relatie tot ruimtelijk domein en actualiseren producten en diensten	Loopt. Gaat in afstemming met dienstverlening gemeentebreed.	Najaar 2022	

5. Bestuurlijke samenwerking			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning gereed</i>	<i>Groen/ rood</i>
Nieuwe afspraken over taken, financiën en processen	Via periodiek regionale afstemming (res.p. programmaleiders, teamleiders en bestuurlijk). Op niveau van processen gereed.	Najaar 2022	

6. Informatievoorziening			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning gereed</i>	<i>Groen/ rood</i>
VTH Software aanschaffen, inrichten en in lijn brengen met Omgevingswet	Loopt via eigen project. Er wordt onderling periodiek afgestemd. Project is vertraagd, door niet tijdige levering van functionaliteiten uit PvE door leverancier.	December 2022	
Toepasbare regels. Software aanschaffen en inhoudelijke verdieping.	Software aangeschaft. Enkel hoognodige voor inwerkingtreding wet. Overige in de overgangperiode.	2023/2024	
Impact voor ICT komende jaren in beeld brengen	Vertraagd i.v.m. capaciteit afdeling en uitstel wet.	Najaar 2022	

7. Participatie en communicatie			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning gereed</i>	<i>Groen/ rood</i>
Participatiebeleid en verplichte participatie	Gereed. Vastgesteld door de raad.	Januari 2022	
Inspraakverordening en uitvoeringsplan n.a.v. beleid	Vervolgacties in beeld gebracht. Uitvoering grotendeels nog starten	Najaar 2022	
Plan van aanpak voor interne en externe communicatie	Gereed. Beknopt plan van aanpak voor communicatiemomenten.	Voorjaar 2022	

8. Werkprocessen			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning gereed</i>	<i>Groen/rood</i>
VTH processen aanpassen aan eisen wet (vooroverleg, toezicht & handhaving en behandelen aanvraag incl. indieningsvereisten als participatie en termijn van 26 naar 8 weken in de meeste gevallen)	Belangrijkste interne werkprocessen uitgewerkt. Regionaal eindrapport werkprocessen opgeleverd over samenwerking gemeenten & ketenpartners (termijnen, processtappen etc)	Voorjaar 2022	
Oefenen met nieuwe processen en randvoorwaarden creëren m.b.t. personele inzet	Vertraagd i.v.m. gebrek aan capaciteit		
Vorbereiding op Wet kwaliteitsborging in relatie tot Omgevingswet	Loopt. Wordt meegenomen in processen en wordt proefproject gestart.	Najaar 2022	
Gemeentelijke adviescommissie	Verordening september 2021 vastgesteld. Werving en voordracht benoeming nog starten.	Najaar 2022	

Naam programma: Duurzaamheid	
Bestuurlijk opdrachtgever	J. Groothuis
Overige leden Stuurgroep	M. Storteboom
Ambtelijk opdrachtgever	A. Dickhof
Projectleider	J. Schoonhoven

Aanleiding
<p>Nunspeet is actief aan de slag met het onderwerp Duurzaamheid. In 2016 heeft de gemeenteraad het 'Masterplan duurzaamheid 2016-2025 'Nunspeet Duurzaam - Tijd voor nieuwe energie' vastgesteld, met daarin het volgende hoofddoel: 'Nunspeet is in 2050 klimaatneutraal voor zover het de energieproductie betreft en 100% CO2 reductie ten opzichte van het basisjaar 1990'. Ter uitvoering van het Masterplan is een 'Uitvoeringsprogramma's Duurzaamheid' (2017) vastgesteld, waarin concrete projecten en maatregelen zijn benoemd. In 2020 is het programma Duurzaamheid vastgesteld, waarin de ambitie in het staande beleid zijn meegenomen.</p> <p>Het belang van de duurzaamheidsopgave is in het Coalitieakkoord 2018-2022 'Duurzaam koers houden' onderstreept. Het thema Duurzaamheid is één van de vijf speerpunten van het akkoord. Hierin is aangekondigd is dat het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid wordt aangepast.</p> <p>Deze gewenste aanpassing wordt fundamenteel opgepakt.</p>

Voortgang op hoofdlijnen			
Fase	Gewenst product	Planning	Resultaat
her-oriëntatie	programma	April 2020	Programma Duurzaamheid
uitvoering	uitvoeren programma	2020-2026	volgt
evaluatie	evaluatienotitie	2026	volgt

Voortgang van de fase waarin het programma zich bevindt
<p>De fundamenteel vernieuwde aanpak van duurzaamheid bevindt zich in de uitvoeringsfase. Samen met stakeholders is de huidige situatie geanalyseerd en is een programma opgesteld. Dit programma is in oktober 2019 aangeboden aan de commissie Ruimte en Wonen ter peiling. In april 2020 is het programma Duurzaamheid vastgesteld door de raad. Duurzaamheid is breder opgepakt, en in het programma is meer duidelijkheid gekomen over rollen en taken.</p> <p>Binnen het programma Duurzaamheid worden zes pijlers onderscheiden. Iedere pijler bevat verschillende projecten en activiteiten die bijdragen aan de ambitie die binnen de desbetreffende pijler geldt. Afgelopen jaar hebben uiteraard diverse projecten en activiteiten doorgang gevonden. In deze hoofdlijnrapportage wordt ingegaan op de belangrijkste projecten en activiteiten per pijler en de voortgang daarbij.</p> <p>De pijlers die binnen Programma Duurzaamheid onderscheiden worden zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Energiebesparing 2. Energieopwekking 3. Energietransitie 4. Groene Mobiliteit 5. Klimaatadaptie en Biodiversiteit 6. Circulaire Economie <p>Het programma Duurzaamheid is in de raad van april 2020 vastgesteld, derhalve moeten een groot aantal projecten nog opgestart worden. Daarnaast is eind 2021 een tussenmeting uitgevoerd. Op 7 februari 2022 is de tussenmeting besproken in de commissie Ruimte en Wonen. De uitkomsten zijn meegenomen in de coalitieonderhandelingen 2022.</p>

1. Energiebesparing			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/ rood</i>
LED-verlichting openbare ruimte	Er wordt op dit moment gewerkt aan een discussienota LED-verlichting openbare ruimte	Afgerond in februari 2022	
Energiebesparing gemeentelijk vastgoed	Diverse acties inmiddels in gang gezet: o.a. glas vervangen gemeentehuis. De warmtebron van het gemeentehuis is in 2021 vervangen. Lijst met maatregelen 2022 worden begin 2022 voorgelegd aan de raad.	Loopt gehele jaar door	
Strategisch vastgoedbeleid gemeentelijke gebouwen inclusief duurzaamheid	Een eerste opzet voor beleidsdocument is gereed. Nieuwe medewerker vastgoed is 1 juni 2021 begonnen. Verwachte oplevering oktober 2022	Oktober 2022	
Energiekloet: energieadviesgesprekken	Veluwe Duurzaam pakt dit op	Loopt	
Reductieregeling Energiegebruik en Reductie Regeling Energiegebruik Woningen	Gestart. Loopt het hele jaar door tot en met 2022. Diverse acties richting burgers en bedrijven. Samen met Veluwe Duurzaam. In verband met Corona loopt dit door tot eind 2022	Loopt	
Revolverend fonds voor bedrijven	Revolverend fonds is in werking.	Loopt	

2. Energieopwekking			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/ rood</i>
Beleidskader grootschalige opwek zonne-energie	Definitieve beleidskader zonne-energie vastgesteld in de raad van december 2020. Er wordt een uitvraag gedaan mbt. één pilot project.	Gereed	
Onderzoek ruimtelijke mogelijkheid grootschalige energieproductie	Onderzoek is tijdelijk on hold gezet in verband met onderzoek provincie naar (on) mogelijkheden windenergie i.r.t. Natura2000 gebieden.	2022	
Lening toekomstbestendig wonen	Uitwerking is gereed. Lening is ingesteld.	Loopt	
Zon op Daken (gemeenschappelijk inkoop zonnepanelen)	Project is afgerond en geëvalueerd in februari 2020. Vervolg is in 2021 opgepakt door NunspeetEnergie.	Afgerond	
Projectplan stimuleren grootschalige opwek zon op daken bedrijven (GvO)	Werkzaamheden voor projectplan in april 2020 opgestart. O-gen voerde dit voor gemeente Nunspeet uit. Is moeizaam verlopen.	Voorjaar 2021	
Zonneveld De Kijktuinen	Aanbestedingstraject gestart. Realisatie afgerond.	Afgerond	

Zonnestroominstallatie Manege Hulshorst	Aanbestedingstraject afgerond. Realisatie juli/augustus 2022	2022	
---	---	------	--

3. Energietransitie			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/ rood</i>
Transitievisie warmte (TVW)	Vastgesteld in de raad van april 2020.	Gereed	
Wijkuitvoeringsplannen TVW	Vanaf mei 2020 is hier verder invulling aangegeven	2020/2021	
Bedrijvenaankpak Feithenhof	Begin 2021 is gestart met een bedrijvenaankpak op bedrijventerrein Feithenhof. Het thema duurzaamheid is in de breedte onder de aandacht geweest. Projecten worden gekoppeld aan te organiseren parkmanagement. De bedrijvenaankpak is verder uitgebreid naar De Kolk en Lepelingen I/II	2021/2022	
Regionale Energiestrategie	Definitieve RES is in mei 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Opstart voor RES 2.0 is gestart. (door)startnotitie RES 2.0 en 3.0 wordt met nieuwe gemeenteraad opgepakt in 2022	Loopt	
Aankpak duurzaamheid vitale vakantieparken	Programma vitale vakantieparken is gestart, Duurzaamheid wordt als thema meegenomen.	Loopt	
Energieplan maatschappelijke instellingen	Hier is inmiddels mee gestart. Verwacht planning najaar 2022. In verband met capaciteitstekort uitgesteld.	Najaar 2022	

4. Groene Mobiliteit			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/ rood</i>
Deelauto inclusief campagne stimulerend gebruik	In verband met de Corona-crisis is de levering tijdelijk on-hold gezet i.v.m. minimaal gebruik. Begin september volgt collegeadvies hoe hier verder mee om te gaan. Advies is afhankelijk van Corona aanschaf 2 deelauto's in gang zetten.	Gereed	
Laadinfrabeleid	Opstellen laadinfrabeleid. Verwachte oplevering voorjaar 2022. In verband met capaciteitstekort uitgesteld.	Najaar 2022	
Plan van aanpak Groene Mobiliteit	Plan van aanpak Groene Mobiliteit is inmiddels opgepakt. In verband met capaciteitstekort	Najaar 2022	

	uitgesteld.		
--	-------------	--	--

5. Klimaatadaptie en Biodiversiteit			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/ rood</i>
Beleid openbare ruimte (Biodiversiteit)	Beleid is vastgesteld. Op dit wordt gekeken hoe het beleid verder uitgevoerd gaat worden.	Start 2020	
Gemeentelijke monumentale bomen (bodemverbetering i.v.m. duurzaam behoud voor o.a. preventie hittestres)	Wordt op dit moment actief opgepakt. Heeft plaatsgevonden voor het tweede jaar op rij.	Mei 2020	
Klimaatadaptatieplan	Klimaatadaptatieplan is in december vastgesteld door de raad	Gereed	
Natuur inclusief bouwen	Wordt actief meegenomen in de vooroverleggen bij woningbouw	Start 2020	
Actie Steenbreek	Actie Steenbreek krijgt een iets andere invulling. 2022 wordt eea verder opgepakt	2022	
Afkoppelen hemelwater	Wordt invulling aangegeven	Loopt	

6. Circulaire economie			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/ rood</i>
Realisatie milieustraat	Besluitvorming 2021. Voorbereiding 2022. Realisatie 2022/2023	2022/2023	
Onderzoek Diftar	Besluitvorming 2021	2021	
Actieagenda Circulariteit	Wordt opgepakt in 2022	2022	

Naam programma: Sociaal Domein	
Bestuurlijk opdrachtgever	J. Elskamp
Overige leden Stuurgroep	W. Stoffer, J.C. Bos,
Ambtelijk opdrachtgever	J.C. Bos
Projectleider	G.J. van Bruchem

Aanleiding
<p>Het sociaal domein is volop in beweging. Er vinden veel veranderingen plaats en er komen steeds meer grote, strategische thema's en domeinoverstijgende taken en complexe, doelgerichte opgaven op de gemeente af. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de wet verplichte GGZ (Wvvggz), de woonzorg opgave en de aankomende decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang van de centrumgemeenten naar de lokale gemeenten.</p> <p>Ook de totale (financiële) omvang van het sociaal domein neemt daarmee toe.</p> <p>Met de toename van het aantal gemeentelijke taken op het gebied van het sociaal domein en landelijke ontwikkelingen als het langer thuis wonen en de afbouw van de intramurale zorgcapaciteit zie we als gemeente ook een toename van het aantal complexe zorgvragen. Dit vraagt zowel om een integrale aanpak als een integrale uitvoering.</p> <p>De gemeente Nunspeet heeft begin 2021 een strategisch kader voor het sociaal domein opgesteld in de vorm van een visie sociaal domein. In de visie sociaal domein zijn er een aantal strategische lijnen uitgezet voor de toekomst, die verder uitgewerkt zijn in het beleidsplan sociaal domein (vastgesteld in november 2021) en vervolgens worden uitgewerkt via een ontwikkelagenda in uitvoeringsplannen..</p> <p>De ontvouwing van deze visie Sociaal Domein en de vertaling naar een beleidsplan, als koers voor de komende jaren, vraagt daarnaast ook extra aandacht en inzet van de gemeentelijke organisatie. We gaan als het ware verbouwen met de winkel open.</p> <p>Kortom: met het opstellen van de visie is de stip op de horizon gezet en vertaald in doelen en maatschappelijke effecten in het integrale beleidsplan. Dit is onze integrale koers voor het sociaal domein. Die wordt ondersteund en aangejaagd vanuit het programma sociaal domein.</p> <p>Doelstelling:</p> <p>Uiteindelijk is het doel om de visie te realiseren en de organisatie daarop af te stemmen. Om dat te kunnen is het inrichten van een programma nodig. Binnen het programma sociaal domein is de visie vertaald naar een beleidsplan met maatschappelijke effecten en doelstellingen die de komende jaren het programma sociaal domein bepalen. De ontwikkelagenda beschrijft de focus voor de komende periode en er volgen uitvoeringsplannen voor de diverse onderdelen voor de korte termijn. Zo houden we de focus op het bereiken van de stip op de horizon.</p>

Voortgang op hoofdlijnen			
Fase	Gewenst product	Planning	Resultaat
Oriëntatie en voorbereiding	startnotitie	Voorjaar 2021	gereed
uitvoering	Beleidsplan sociaal domein	Eind 2021	Gereed, vastgesteld op 25-11-201
	Uitvoeringplan sociaal domein - uitvoerings/ontwikkel agenda - uitvoeringsplannen	Eind 2021/begin 2022 3 ^e kwartaal 2022 (volgt na het collegeprogramma) Aansluitend aan de uitvoeringsagenda	Projectplan gereed, uitvoering eerste helft 2022
	Monitor sociaal domein	Projectplan eind 2021, uitvoering 2022-2023	Projectplan gereed
	Diverse ontwikkelprojecten,	Projectplan na de zomer	

	zoals sociale basis		

Voortgang van de fase waarin het programma zich bevindt

Het programma bevindt zich in de **uitvoeringsfase**. De visie sociaal domein is op 25 maart 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Het integraal beleidsplan sociaal domein is vastgesteld op 25 november 2021. De ontwikkelagenda zal in september 2022 worden voorgelegd aan het college, na vaststelling van het collegeprogramma.

De programmaliijn uitvoering wordt momenteel ingericht (via een bestuursopdracht). De doorvertaling richting de uitvoering wordt ontwikkeld, samen met de partijen in- en extern. De betrokken teams hebben een inspiratiemiddag bijgewoond die in het teken stond van werken vanuit de bedoeling. en is bezig met het proces rondom uitvoeringsagenda en vervolgens uitvoeringsplannen. De omgeving (zowel in- als extern is betrokken bij het prioriteren van de onderwerpen in de ontwikkelagenda. Hiervoor is de projectleider nog steeds betrokken.

Enmaal per zes weken komt de stuurgroep programma sociaal domein bijeen en eens per vier weken is er een programmagroep met de ambtelijk opdrachtgever. De projectgroep komt wekelijks bij elkaar.
